

令和6年度優秀工事表彰

○工事に関する事項

1. 工 事 番 号 4 壱建土第 1 2 0 号
2. 工 事 名 称 いっきゅうしどうすみよしふなばしせんどうろかいりょうこうじ
1 級市道住吉船橋線道路改良工事
3. 施 工 場 所 壱岐市郷ノ浦町木田触
4. 工 期 令和4年8月9日 ～ 令和6年1月30日
5. 請 負 契 約 額 43,084,800円
6. 工事成績評定点 81点
7. 工 事 概 要 工事延長L=0.0(275.0)m 道路幅員W=5.5(6.5)m
張コンクリート工 A=1,527.0m² 側溝工 L=208.0m
ガードレール設置工 L=239.0m 下層路盤 A=1,870.0m²

○施工業者

1. 商号又は名称 株式会社 みやさかぐみ 宮坂組
2. 代 表 者 名 代表取締役 みやさか 宮坂 みつはる 満治
3. 住 所 長崎県壱岐市芦辺町国分本村触1234番地

○現場技術者

1. 氏 名 ひらた 平田 じゅんや 純也

○優秀工事として表彰する理由

・本事業は、県営圃場整備事業と河川改修事業に併せて実施している道路改良事業である。本工事については、当初から県営圃場整備事業の入札不調や、地元要望等による計画変更等により、工程の見直しが何度も必要となった工事である。また、複数業者が工事区間を重複しての施工となること、地元からの強い要望により現道を供用しながらの施工が必要となったこと等から、工程管理・現場管理にも大変苦労された工事である。

しかし、そのような状況において、重複工事業者間で主体的な役割を担い、発注者を含めた連絡調整会議を月毎に開催され、その会議には、現場担当のみではなく、社長も出席される等、会社全体としての現場のバックアップ態勢により、工事の良好な進捗管理に努める姿勢が見られた。また、度重なる設計変更・追加工事に対しても、迅速な変更資料の作成・提出や、的確な現場対応が多く見られた工事である。

上記のような状況の中、適切な工程管理、現場管理、安全管理により、週休2日モデル工事における4週8休を達成しつつ、無事故で現場を竣工されたことから、他の工事の見本となるべく工事であると考え、優秀工事として表彰する。

着工前



全景 (No.22~No.36)


竣工



全景 (No.22~No.36)

計画平面図

L=0.0(275.0) m
令和4年度工事延長 ±0.0(240.0) m
道路幅員 W=5.5 (6.5) m

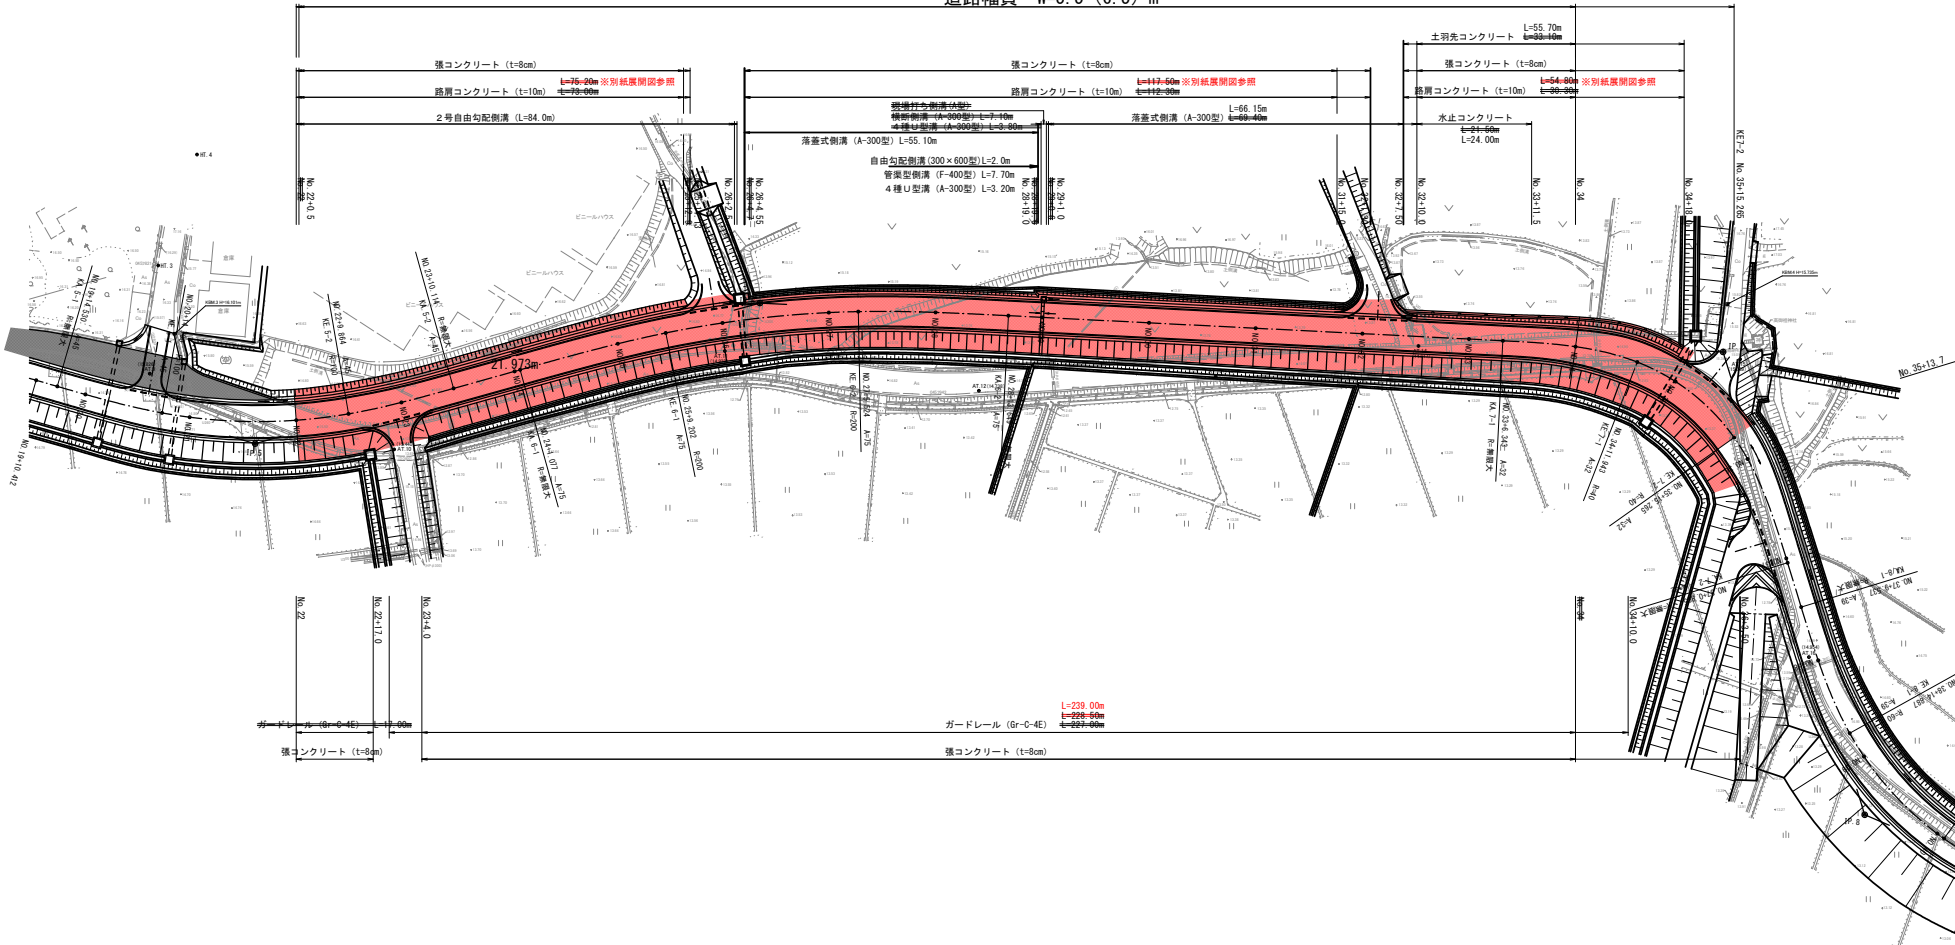

更正

年 度	令和4年度
工 事 名	1級市道住吉船橋線道路改良工事
施工箇所	沓岐市 郷ノ浦町 木田融
図面種類	計画平面図
縮 尺	S=1:500
図面番号	25葉の内 1号
